

planning
Universitat de Girona

desde mié 14/06/06

Fechas

Comienzo:	lun 27/02/06	Fin:	vie 12/05/06
Comienzo previsto:	NA	Fin previsto:	NA
Comienzo real:	NA	Fin real:	NA
Variación de comienzo:	0 días	Variación de fin:	0 días

Duración

Programada:	55 días	Restante:	55 días
Prevista:	0 días?	Real:	0 días
Variación:	55 días	Porcentaje completado:	0%

Trabajo

Programado:	981,53 horas	Restante:	981,53 horas
Previsto:	0 horas	Real:	0 horas
Variación:	981,53 horas	Porcentaje completado:	0%

Costos

Programados:	20.585,02 €	Restantes:	20.585,02 €
Previstos:	0,00 €	Reales:	0,00 €
Variación:	20.585,02 €		

Estado de las tareas

Tareas aún no comenzadas:	39
Tareas en curso:	0
Tareas finalizadas:	0
Total de tareas:	39

Estado de los recursos

Recursos de trabajo:	3
Recursos de trabajo sobreasignados:	3
Recursos materiales:	7
Total de recursos:	13

Tareas y recursos humanos el mié 14/06/06
planning

Id




Nombre del recurso

Trabajo

Identificador	Nombre de tarea	Unidades	Trabajo	Retraso	Comienzo	Fin
1	Enginyer	415,93 horas				
4	Escollir sistema fabricació	100%	16 horas	0 días	lun 27/02/06	mar 28/02/06
5	Escollir materials	100%	16 horas	0 días	mié 01/03/06	jue 02/03/06
10	Determinar línia de desmoldeig	100%	16 horas	0 días	vie 03/03/06	lun 06/03/06
35	Redacció estudi seguretat i salut	10%	3,2 horas	0 días	vie 03/03/06	mié 08/03/06
34	Redacció de la memòria	10%	0,73 horas	0 días	lun 27/02/06	lun 27/02/06
9	Determinar situació forats	100%	8 horas	0 días	lun 27/02/06	lun 27/02/06
11	Determinar parts transparents (visibilitat)	100%	24 horas	0 días	mar 07/03/06	jue 09/03/06
12	Determinar acoplament de les parts de la carrosseria	100%	16 horas	0 días	vie 10/03/06	lun 13/03/06
13	Determinar acoplament carrosseria-xassís	100%	16 horas	0 días	mar 14/03/06	mié 15/03/06
14	Determinar gruixudàries i reforços	100%	40 horas	0 días	lun 20/03/06	vie 24/03/06
15	Determinar acabats	100%	16 horas	0 días	lun 27/03/06	mar 28/03/06
17	Estudi preliminar del motlle	50%	12 horas	0 días	vie 03/03/06	mar 07/03/06
18	Disseny del motlle	100%	40 horas	0 días	lun 27/03/06	vie 31/03/06
19	definir les parts de la producció	100%	24 horas	0 días	lun 03/04/06	mié 05/04/06
20	Determinar els recursos necessaris	100%	24 horas	0 días	jue 06/04/06	lun 10/04/06
21	Aprovisionament dels materials	100%	24 horas	0 días	mar 11/04/06	jue 13/04/06
22	Aprovisionament de les eines/màquines	100%	24 horas	0 días	mar 11/04/06	jue 13/04/06
23	Coordinació d'horaris i recursos humans	100%	8 horas	0 días	mar 11/04/06	mar 11/04/06
36	Redacció plec de condicions	100%	32 horas	0 días	mar 11/04/06	vie 14/04/06
37	Realització dels plànols	100%	32 horas	0 días	vie 03/03/06	mié 08/03/06
38	Redacció del pressupost	100%	24 horas	0 días	mar 11/04/06	jue 13/04/06
2	Motllista	100 horas				
10	Determinar línia de desmoldeig	100%	16 horas	0 días	vie 03/03/06	lun 06/03/06
17	Estudi preliminar del motlle	50%	12 horas	0 días	vie 03/03/06	mar 07/03/06
18	Disseny del motlle	100%	40 horas	0 días	lun 27/03/06	vie 31/03/06
26	Adequació del motlle	100%	32 horas	0 días	vie 14/04/06	mié 19/04/06
3	Redactor	121,6 horas				
34	Redacció de la memòria	90%	57,6 horas	0 días	lun 27/02/06	mié 08/03/06
35	Redacció estudi seguretat i salut	100%	32 horas	0 días	vie 03/03/06	mié 08/03/06
36	Redacció plec de condicions	100%	32 horas	0 días	mar 11/04/06	vie 14/04/06
4	Calculista	56 horas				
5	Escollir materials	100%	16 horas	0 días	mié 01/03/06	jue 02/03/06
14	Determinar gruixudàries i reforços	100%	40 horas	0 días	lun 20/03/06	vie 24/03/06
5	Operari	168 horas				
26	Adequació del motlle	100%	32 horas	0 días	vie 14/04/06	mié 19/04/06
27	Laminat de la carrosseria	100%	32 horas	0 días	jue 20/04/06	mar 25/04/06
28	Termoconformat de les parts transparents	100%	16 horas	0 días	mié 26/04/06	jue 27/04/06
29	Fer els forats per a les finestres i rodes	100%	24 horas	0 días	vie 28/04/06	mar 02/05/06
30	Fixar el plàstic de les finestres	100%	24 horas	0 días	mié 03/05/06	vie 05/05/06
31	Fixar la carrosseria inferior al xassís i fer l'acoblament	100%	24 horas	0 días	lun 08/05/06	mié 10/05/06
32	Posar els adhesius	100%	16 horas	0 días	jue 11/05/06	vie 12/05/06
12	Estudiant	120 horas				
8	Aprender programa de càlcul	100%	120 horas	0 días	lun 27/02/06	vie 17/03/06

Hitos el mié 14/06/06
planning

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos
1	PROJECTE	55 días	lun 27/02/06	vie 12/05/06		
2	Inici	0 días	lun 27/02/06	lun 27/02/06		
3	Estudis prèvis	4 días	lun 27/02/06	jue 02/03/06		
6	Rebre geometria carrosseria	0 días	lun 27/02/06	lun 27/02/06		
39	Final	0 días	vie 12/05/06	vie 12/05/06	34;38;37;36	

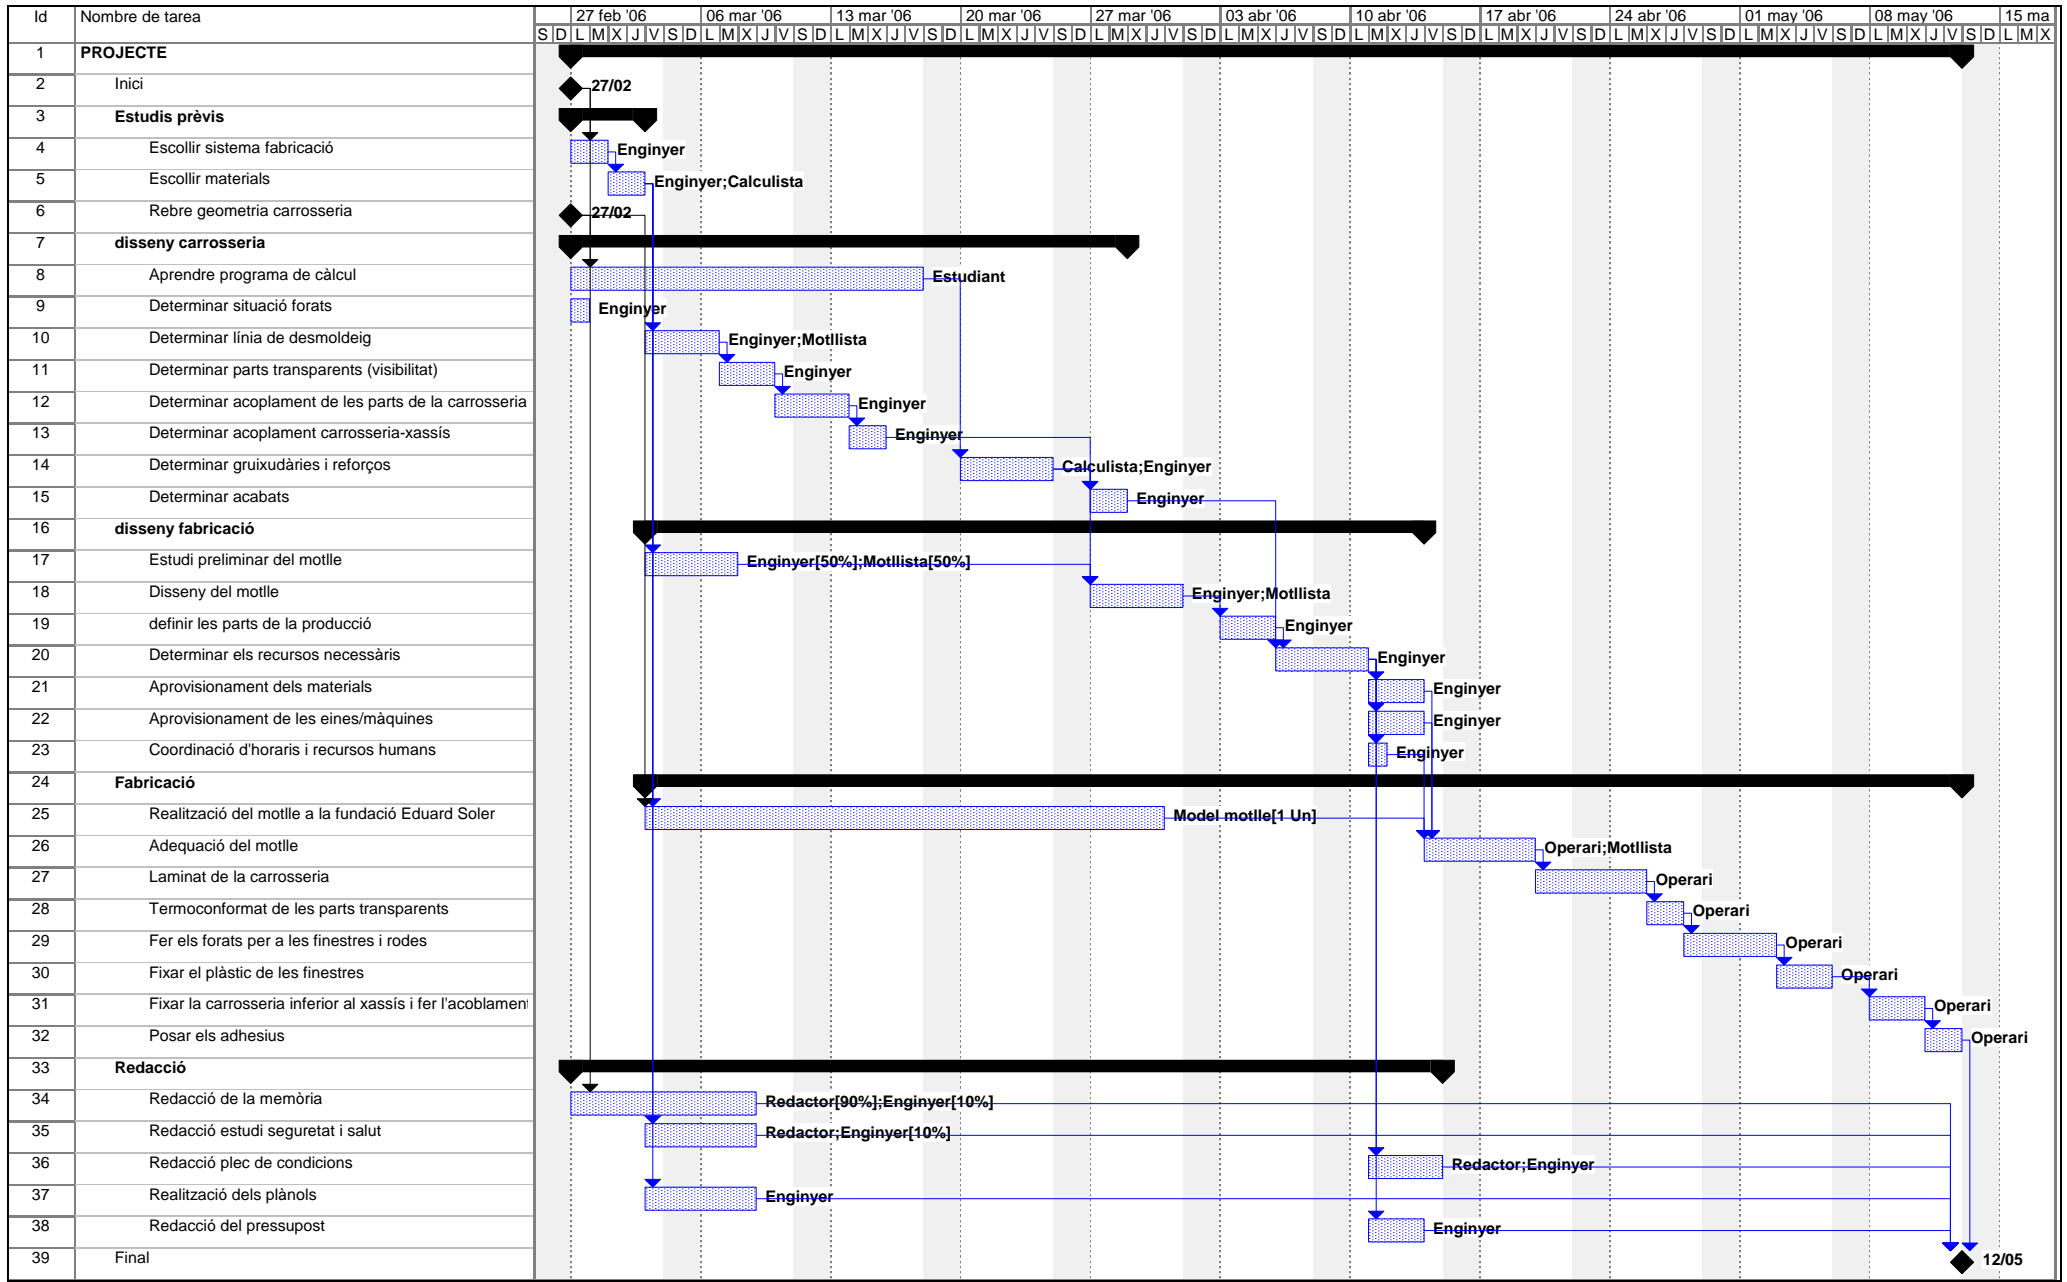


Proyecto: planning
 Fecha: mié 14/06/06

Tarea: Progreso
 División: Hito

Resumen
 Resumen del proyecto

Tareas externas
 Hito externo

Fecha límite

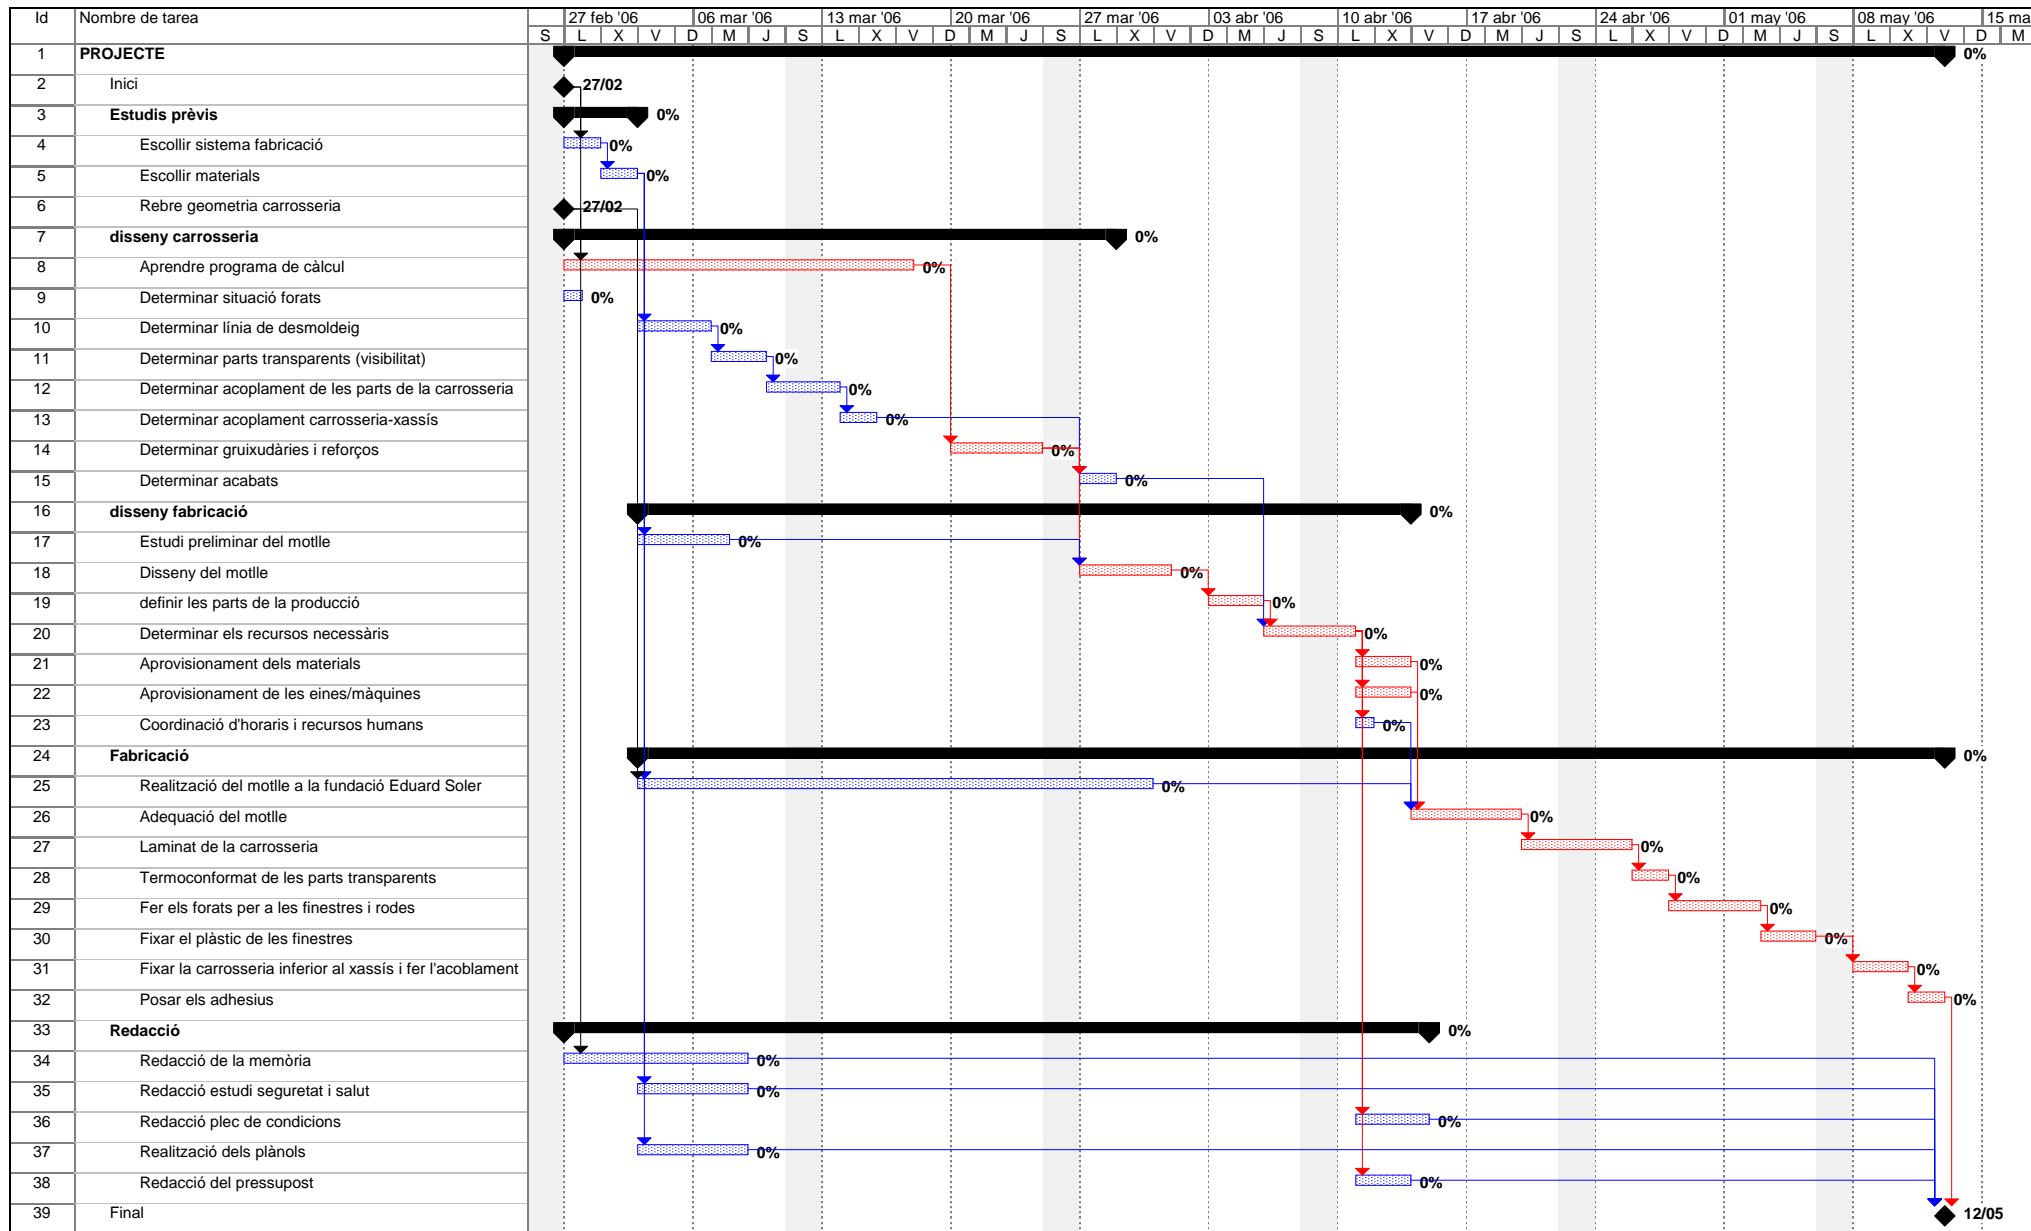

Projecto: planning
Fecha: mié 14/06/06

Tareas críticas		División		Hito de línea de base		Resumen del proyecto	
División crítica		Progreso de tarea		Hito		Tareas externas	
Progreso de tarea crítica		Línea de base		Progreso del resumen		Hito externo	
Tarea		División de la línea de base		Resumen		Fecha límite	

Informe presupuestario el mié 14/06/06
planning

Id	Nombre de tarea	Costo fijo	Acumulación de costos fijos	Costo total	Costo previsto	Variación	Real	Restante
14	Determinar gruixudàries i reforços	0,00 €	Prorrateo	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €
18	Disseny del mottle	0,00 €	Prorrateo	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
36	Redacció plec de condicions	0,00 €	Prorrateo	1.504,00 €	0,00 €	1.504,00 €	0,00 €	1.504,00 €
5	Escollir materials	0,00 €	Prorrateo	1.120,00 €	0,00 €	1.120,00 €	0,00 €	1.120,00 €
34	Redacció de la memòria	0,00 €	Prorrateo	1.001,02 €	0,00 €	1.001,02 €	0,00 €	1.001,02 €
26	Adequació del mottle	0,00 €	Prorrateo	960,00 €	0,00 €	960,00 €	0,00 €	960,00 €
37	Realització dels plànols	0,00 €	Prorrateo	960,00 €	0,00 €	960,00 €	0,00 €	960,00 €
10	Determinar línia de desmoldeig	0,00 €	Prorrateo	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €
11	Determinar parts transparents (visibilitat)	0,00 €	Prorrateo	720,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €
19	definir les parts de la producció	0,00 €	Prorrateo	720,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €
20	Determinar els recursos necessaris	0,00 €	Prorrateo	720,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €
21	Aprovisionament dels materials	0,00 €	Prorrateo	720,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €
22	Aprovisionament de les eines/màquin	0,00 €	Prorrateo	720,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €
38	Redacció del pressupost	0,00 €	Prorrateo	720,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €
35	Redacció estudi seguretat i salut	0,00 €	Prorrateo	640,00 €	0,00 €	640,00 €	0,00 €	640,00 €
17	Estudi preliminar del mottle	0,00 €	Prorrateo	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
4	Escollir sistema fabricació	0,00 €	Prorrateo	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €
12	Determinar acoplament de les parts d	0,00 €	Prorrateo	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €
13	Determinar acoplament carrosseria-x	0,00 €	Prorrateo	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €
15	Determinar acabats	0,00 €	Prorrateo	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €
27	Laminat de la carrosseria	0,00 €	Prorrateo	320,00 €	0,00 €	320,00 €	0,00 €	320,00 €
9	Determinar situació forats	0,00 €	Prorrateo	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €
23	Coordinació d'horaris i recursos huma	0,00 €	Prorrateo	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €
29	Fer els forats per a les finestres i rode	0,00 €	Prorrateo	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €
30	Fixar el plàstic de les finestres	0,00 €	Prorrateo	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €
31	Fixar la carrosseria inferior al xassís i	0,00 €	Prorrateo	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €
28	Termoconformat de les parts transpar	0,00 €	Prorrateo	160,00 €	0,00 €	160,00 €	0,00 €	160,00 €
32	Posar els adhesius	0,00 €	Prorrateo	160,00 €	0,00 €	160,00 €	0,00 €	160,00 €
8	Aprendre programa de càlcul	0,00 €	Prorrateo	120,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €	120,00 €
2	Inici	0,00 €	Prorrateo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Rebre geometria carrosseria	0,00 €	Prorrateo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Realització del mottle a la fundació Ec	0,00 €	Prorrateo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Final	0,00 €	Prorrateo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €		20.585,02 €	0,00 €	20.585,02 €	0,00 €	20.585,02 €

Flujo de caja el mié 14/06/06
planning

PROJECTE	27/02/06	06/03/06	13/03/06	20/03/06	27/03/06	03/04/06	10/04/06	17/04/06	24/04/06	01/05/06	08/05/06	Total
Inici												
Estudis prèvis												
Escollir sistema fabricació	480,00 €											480,00 €
Escollir materials	1.120,00 €											1.120,00 €
Rebre geometria carrosseria												
disseny carrosseria												
Aprendre programa de càlcul	40,00 €	40,00 €	40,00 €									120,00 €
Determinar situació forats	240,00 €											240,00 €
Determinar línia de desmoldeig	400,00 €	400,00 €										800,00 €
Determinar parts transparents (visibilitat)		720,00 €										720,00 €
Determinar acoplament de les parts de la carrosseria		240,00 €	240,00 €									480,00 €
Determinar acoplament carrosseria-xassis			480,00 €									480,00 €
Determinar gruixudàries i reforços				2.800,00 €								2.800,00 €
Determinar acabats					480,00 €							480,00 €
disseny fabricació												
Estudi preliminar del motlle	200,00 €	400,00 €										600,00 €
Disseny del motlle					2.000,00 €							2.000,00 €
definir les parts de la producció						720,00 €						720,00 €
Determinar els recursos necessaris						480,00 €	240,00 €					720,00 €
Aprovisionament dels materials							720,00 €					720,00 €
Aprovisionament de les eines/màquines							720,00 €					720,00 €
Coordinació d'horaris i recursos humans							240,00 €					240,00 €
Fabricació												
Realització del motlle a la fundació Eduard Soler												
Adequació del motlle							240,00 €	720,00 €				960,00 €
Laminat de la carrosseria								160,00 €	160,00 €			320,00 €
Termoconformat de les parts transparents									160,00 €			160,00 €
Fer els forats per a les finestres i rodes								80,00 €	160,00 €			240,00 €
Fixar el plàstic de les finestres									240,00 €			240,00 €
Fixar la carrosseria inferior al xassis i fer l'acoblament											240,00 €	240,00 €
Posar els adhesius											160,00 €	160,00 €
Redacció												
Redacció de la memòria	633,82 €	367,20 €										1.001,02 €
Redacció estudi seguretat i salut	160,00 €	480,00 €										640,00 €
Redacció plec de condicions							1.504,00 €					1.504,00 €
Realització dels plànols	240,00 €	720,00 €										960,00 €
Redacció del pressupost							720,00 €					720,00 €
Final												
Total	3.513,82 €	3.367,20 €	760,00 €	2.800,00 €	2.480,00 €	1.200,00 €	4.384,00 €	880,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	20.585,02 €
