

planning2
Universitat de Girona

desde jue 15/06/06

Fechas

Comienzo:	lun 27/02/06	Fin:	lun 22/05/06
Comienzo previsto:	lun 27/02/06	Fin previsto:	vie 12/05/06
Comienzo real:	lun 27/02/06	Fin real:	NA
Variación de comienzo:	0 días	Variación de fin:	6 días

Duración

Programada:	61 días	Restante:	0,52 días
Prevista:	55 días	Real:	60,48 días
Variación:	6 días	Porcentaje completado:	99%

Trabajo

Programado:	1.077,53 horas	Restante:	8 horas
Previsto:	981,53 horas	Real:	1.069,53 horas
Variación:	96 horas	Porcentaje completado:	99%

Costos


Programados:	23.073,02 €	Restantes:	80,00 €
Previstos:	20.585,02 €	Reales:	22.993,02 €
Variación:	2.488,00 €		

Estado de las tareas

Tareas aún no comenzadas:	2
Tareas en curso:	3
Tareas finalizadas:	34
Total de tareas:	39

Estado de los recursos

Recursos de trabajo:	6
Recursos de trabajo sobreasignados:	0
Recursos materiales:	7
Total de recursos:	13

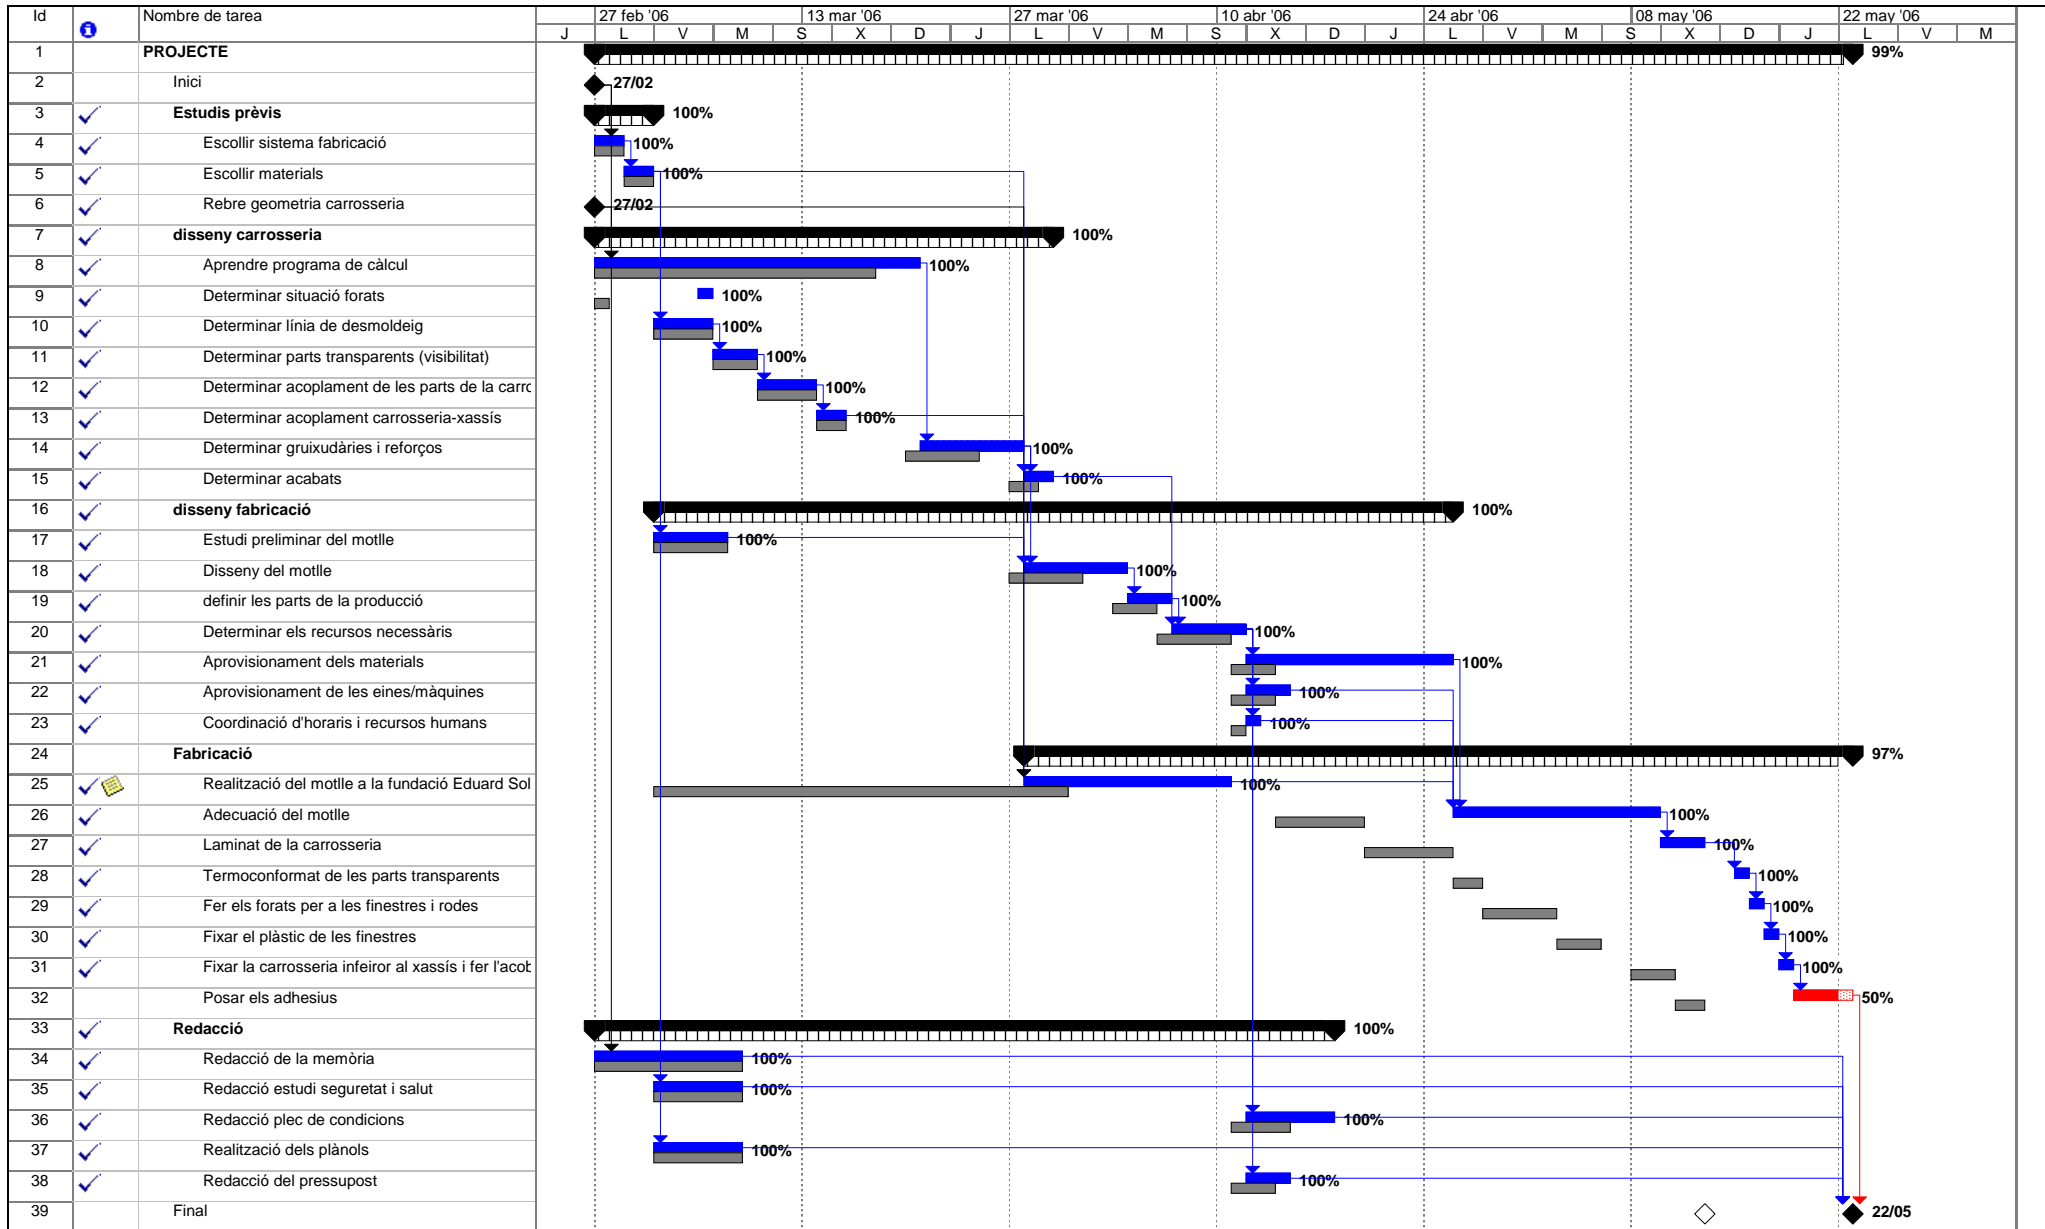

Proyecto: planning2 Fecha: jue 15/06/06	Tareas críticas		División		Hito de línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		Progreso de tarea		Hito		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Línea de base		Progreso del resumen		Hito externo	
	Tarea		División de la línea de base		Resumen		Fecha límite	

Informe presupuestario el jue 15/06/06
planning2

Id	Nombre de tarea	Costo fijo	Acumulación de costos fijos	Costo total	Costo previsto	Variación	Real	Restante
14	Determinar gruixudàries i reforços	0,00 €	Prorrateo	2.800,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.800,00 €	0,00 €
21	Aprovisionament dels materials	0,00 €	Prorrateo	2.400,00 €	720,00 €	1.680,00 €	2.400,00 €	0,00 €
26	Adecuació del motlle	0,00 €	Prorrateo	2.400,00 €	960,00 €	1.440,00 €	2.400,00 €	0,00 €
18	Disseny del motlle	0,00 €	Prorrateo	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
36	Redacció plec de condicions	0,00 €	Prorrateo	1.504,00 €	1.504,00 €	0,00 €	1.504,00 €	0,00 €
5	Escollir materials	0,00 €	Prorrateo	1.120,00 €	1.120,00 €	0,00 €	1.120,00 €	0,00 €
34	Redacció de la memòria	0,00 €	Prorrateo	1.001,02 €	1.001,02 €	0,00 €	1.001,02 €	0,00 €
37	Realització dels plànols	0,00 €	Prorrateo	960,00 €	960,00 €	0,00 €	960,00 €	0,00 €
10	Determinar línia de desmoldeig	0,00 €	Prorrateo	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €
11	Determinar parts transparents (visibili	0,00 €	Prorrateo	720,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €
19	definir les parts de la producció	0,00 €	Prorrateo	720,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €
20	Determinar els recursos necessàris	0,00 €	Prorrateo	720,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €
22	Aprovisionament de les eines/màquin	0,00 €	Prorrateo	720,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €
38	Redacció del pressupost	0,00 €	Prorrateo	720,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €
35	Redacció estudi seguretat i salut	0,00 €	Prorrateo	640,00 €	640,00 €	0,00 €	640,00 €	0,00 €
17	Estudi preliminar del motlle	0,00 €	Prorrateo	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
4	Escollir sistema fabricació	0,00 €	Prorrateo	480,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €
12	Determinar acoplament de les parts d	0,00 €	Prorrateo	480,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €
13	Determinar acoplament carrosseria-xi	0,00 €	Prorrateo	480,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €
15	Determinar acabats	0,00 €	Prorrateo	480,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €
9	Determinar situació forats	0,00 €	Prorrateo	240,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €
23	Coordinació d'horaris i recursos hume	0,00 €	Prorrateo	240,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €
27	Laminat de la carrosseria	0,00 €	Prorrateo	240,00 €	320,00 €	-80,00 €	240,00 €	0,00 €
32	Posar els adhesius	0,00 €	Prorrateo	160,00 €	160,00 €	0,00 €	80,00 €	80,00 €
8	Aprendre programa de càlcul	0,00 €	Prorrateo	128,00 €	120,00 €	8,00 €	128,00 €	0,00 €
28	Termoconformat de les parts transpar	0,00 €	Prorrateo	80,00 €	160,00 €	-80,00 €	80,00 €	0,00 €
29	Fer els forats per a les finestres i rode	0,00 €	Prorrateo	80,00 €	240,00 €	-160,00 €	80,00 €	0,00 €
30	Fixar el plàstic de les finestres	0,00 €	Prorrateo	80,00 €	240,00 €	-160,00 €	80,00 €	0,00 €
31	Fixar la carrosseria infeior al xassís i	0,00 €	Prorrateo	80,00 €	240,00 €	-160,00 €	80,00 €	0,00 €
2	Inici	0,00 €	Prorrateo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Rebre geometria carrosseria	0,00 €	Prorrateo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Realització del motlle a la fundació Ec	0,00 €	Prorrateo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Final	0,00 €	Prorrateo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €		23.073,02 €	20.585,02 €	2.488,00 €	22.993,02 €	80,00 €

Tareas con presupuesto sobrepasado el jue 15/06/06
 planning2

Id	Nombre de tarea	Costo fijo	Acumulación de costos fijos	Costo total	Costo previsto	Variación	Real	Restante
21	Aprovisionament dels materials	0,00 €	Prorrateo	2.400,00 €	720,00 €	1.680,00 €	2.400,00 €	0,00 €
26	Adecuació del motlle	0,00 €	Prorrateo	2.400,00 €	960,00 €	1.440,00 €	2.400,00 €	0,00 €
8	Aprendre programa de càlcul	0,00 €	Prorrateo	128,00 €	120,00 €	8,00 €	128,00 €	0,00 €
		0,00 €		4.928,00 €	1.800,00 €	3.128,00 €	4.928,00 €	0,00 €

Flujo de caja el jue 15/06/06
planning2

PROJECTE	27/02/06	06/03/06	13/03/06	20/03/06	27/03/06	03/04/06	10/04/06	17/04/06	24/04/06	01/05/06	08/05/06	15/05/06	22/05/06	Total
Inici														
Estudis prèvis														
Escollir sistema fabricació	480,00 €													480,00 €
Escollir materials	1.120,00 €													1.120,00 €
Rebre geometria carrosseria														
disseny carrosseria														
Aprendre programa de càlcul	40,00 €	40,00 €	40,00 €	8,00 €										128,00 €
Determinar situació forats		240,00 €												240,00 €
Determinar línia de desmoldeig	400,00 €	400,00 €												800,00 €
Determinar parts transparents (visibilitat)		720,00 €												720,00 €
Determinar acoplament de les parts de la carrosseria		240,00 €	240,00 €											480,00 €
Determinar acoplament carrosseria-xassis			480,00 €											480,00 €
Determinar gruixudàries i reforços				2.240,00 €	560,00 €									2.800,00 €
Determinar acabats					480,00 €									480,00 €
disseny fabricació														
Estudi preliminar del motlle	200,00 €	400,00 €												600,00 €
Disseny del motlle					1.600,00 €	400,00 €								2.000,00 €
definir les parts de la producció						720,00 €								720,00 €
Determinar els recursos necessaris						240,00 €	480,00 €							720,00 €
Aprovisionament dels materials							720,00 €	1.200,00 €	480,00 €					2.400,00 €
Aprovisionament de les eines/màquines							720,00 €							720,00 €
Coordinació d'horaris i recursos humans							240,00 €							240,00 €
Fabricació														
Realització del motlle a la fundació Eduard Soler														
Adecuació del motlle									720,00 €	1.200,00 €	480,00 €			2.400,00 €
Laminat de la carrosseria											240,00 €			240,00 €
Termoconformat de les parts transparents												80,00 €		80,00 €
Fer els forats per a les finestres i rodes												80,00 €		80,00 €
Fixar el plàstic de les finestres												80,00 €		80,00 €
Fixar la carrosseria infeior al xassis i fer l'acoblament												80,00 €		80,00 €
Posar els adhesius												80,00 €	80,00 €	160,00 €
Redacció														
Redacció de la memòria	633,82 €	367,20 €												1.001,02 €
Redacció estudi seguretat i salut	160,00 €	480,00 €												640,00 €
Redacció plec de condicions							1.128,00 €	376,00 €						1.504,00 €
Realització dels plànols	240,00 €	720,00 €												960,00 €
Redacció del pressupost							720,00 €							720,00 €
Final														
Total	3.273,82 €	3.607,20 €	760,00 €	2.248,00 €	2.640,00 €	1.360,00 €	4.008,00 €	1.576,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	720,00 €	400,00 €	80,00 €	23.073,02 €
